

SAÉ 2.05

Gestion d'un projet

Objectifs génériques

Introduction

Projet EllaDanse

- Rédiger un cahier des charges
- Construire un dossier de gestion de projet
- Réaliser une étude de coûts
- Se familiariser avec la conduite de projets

- cf. Note de cadrage
- Lot 2 : gestion des paiements

Sommaire

I) Déroulement théorique

- A) OT, RACI et estimation des charges
- B) Gantt prévisionnel


II) Déroulement réel

- A) Charges réelles
- B) Gantt réel
- C) Difficultés et réponses mises en œuvre

III) Rapports

- A) Commentaires et explications sur les rapports

Organigramme des tâches

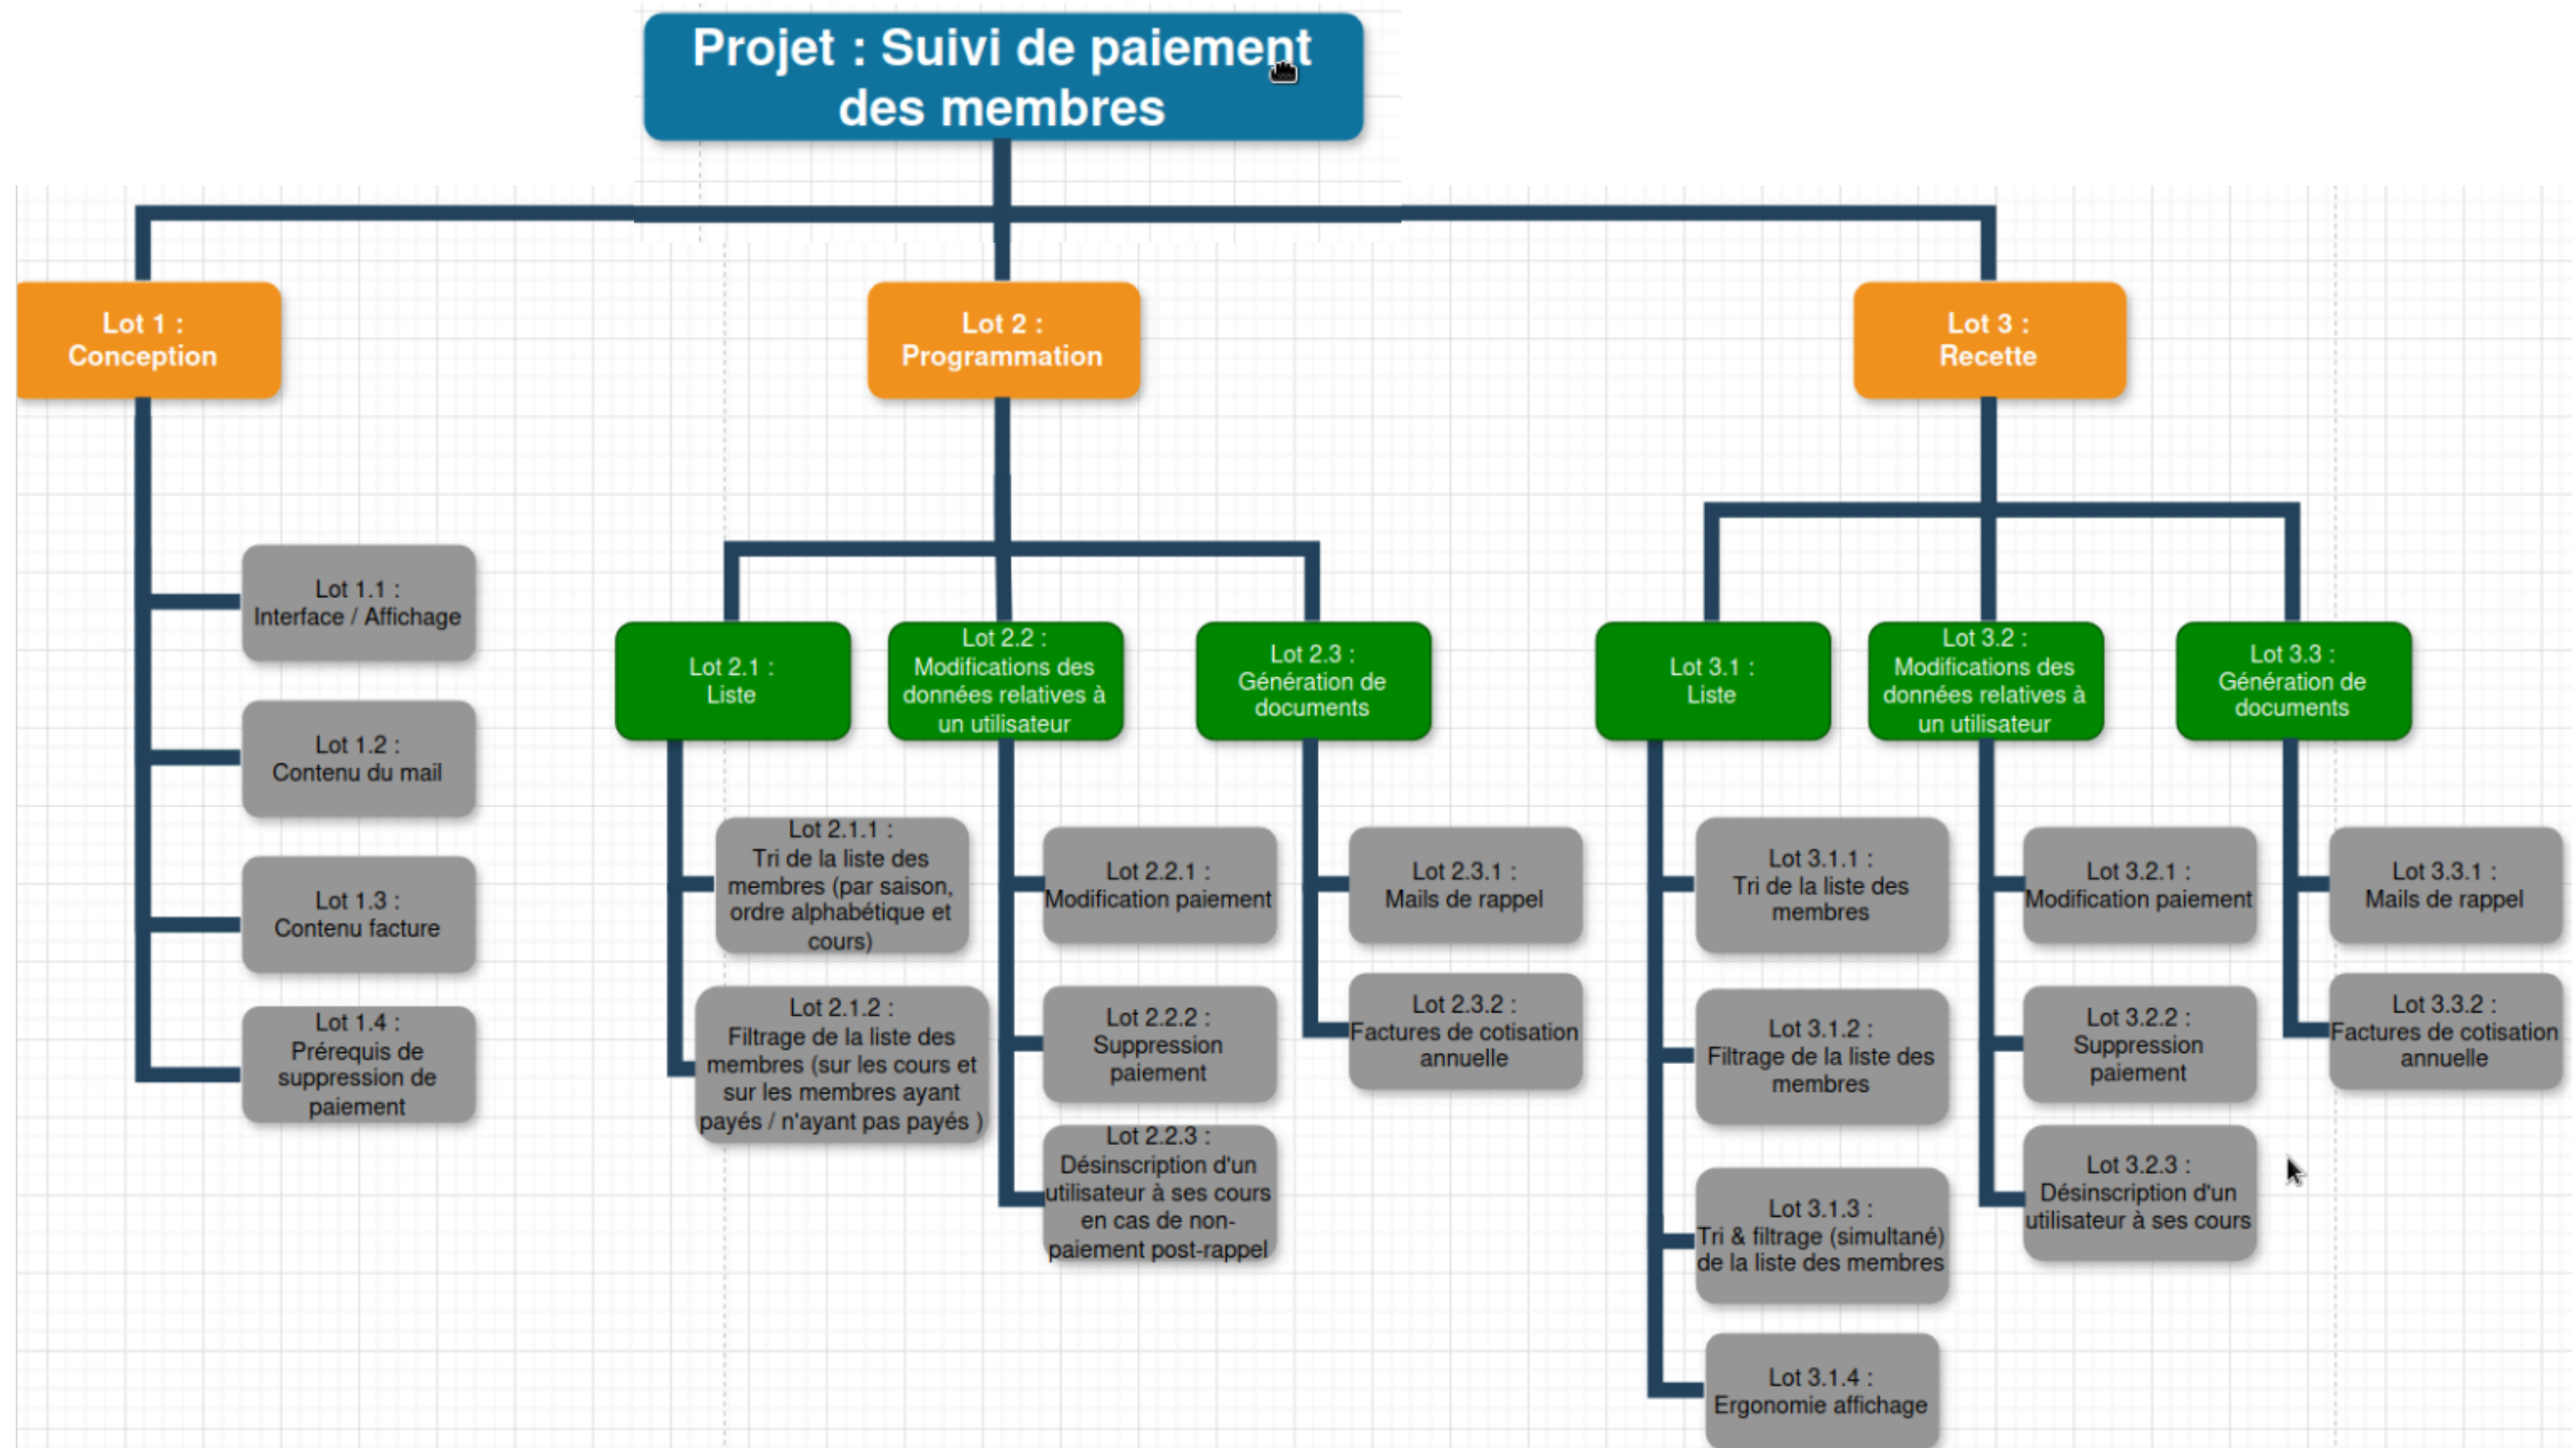

Déroulement théorique >> OT, RACI et estimation des charges

Lots	Julien	Mael U.	Maël D.
Lot 1 : Conception	R		
Lot 1.1 : Interface / affichage		RA	
Lot 1.2 : Contenu du mail			RA
Lot 1.3 : Contenu de la facture	RA		
Lot 1.4 : Prérequis de suppression de paiement		RA	
Lot 2 : Programmation		R	
<u>Lot 2.1 : Liste</u>			R
Lot 2.1.1 : Tri de la liste des membres (par saison, ordre alphabétique et cours)		RA	
Lot 2.1.2 : Filtrage de la liste des membres (sur les cours et sur les membres ayant payés / n'ayant pas payés)		RA	
<u>Lot 2.2 : Modification des données relatives à un utilisateur</u>	R		
Lot 2.2.1 : Modification paiement		C	RA
Lot 2.2.2 : Suppression paiement			RA
Lot 2.2.3 : Désinscription d'un utilisateur à ses cours en cas de non paiement post-rappel	RA		
<u>Lot 2.3 : Génération de documents</u>		R	
Lot 2.3.1 : Mails de rappel			RA
Lot 2.3.2 : Génération de factures de cotisation annuelle	RA		
Lot 3 : Recette			R
<u>Lot 3.1 : Liste</u>		R	
Lot 3.1.1 : Tri de la liste des membres		I	RA
Lot 3.1.2 : Filtrage de la liste des membres		I	RA
Lot 3.1.3 : Tri & filtrage (simultané) de la liste des membres		I	RA
Lot 3.1.4 : Ergonomie affichage	RA	I	
<u>Lot 3.2 : Modification des données relatives à un utilisateur</u>			R
Lot 3.2.1 : Modification paiement	RA		I
Lot 3.2.2 : Suppression paiement	RA		I
Lot 3.2.3 : Désinscription d'un élève à un cours	I	RA	
<u>Lot 3.3 : Génération de documents</u>	R		
Lot 3.3.1 : Mails de rappel		RA	I
Lot 3.3.2 : Génération de factures	I	RA	

Déroulement théorique >> OT, RACI et estimation des charges

Sous-Lots	a	m	p	Estimation	Coût
	6,5	11,5	19	11,92	715 €
1.1 : Interface / affichage	3	5	8	5,17	310 €
1.2 : Contenu du mail	0,5	1	2	1,08	65 €
1.3 : Contenu de la facture	1	2	4	2,17	130 €
1.4 : Prérequis de suppression de paiement	2	3,5	5	3,50	210 €
	13,5	23,5	34	23,50	1 410 €
	2	4,5	7	4,42	265 €
2.1.1 : Tri de la liste des membres (par saison, ordre alphabétique et cours)	1	2,5	4	2,42	145 €
2.1.2 : Filtrage de la liste des membres (sur les cours et sur les membres ayant payés / n'ayant pas payés)	1	2	3	2,00	120 €
	8	14	21	14,17	850 €
2.2.1 : Modification paiement	2	4	6	4,00	240 €
2.2.2 : Suppression paiement	3	5	8	5,17	310 €
2.2.3 : Désinscription d'un utilisateur à ses cours en cas de non paiement post-rappel	3	5	7	5,00	300 €
	3,5	5	6	4,92	295 €
2.3.1 : Mails de rappel	1	1,5	2	1,50	90 €
2.3.2 : Génération de factures de cotisation annuelle	2,5	3,5	4	3,42	205 €
	7,5	12,5	20	12,92	775 €
	3	5,5	8	5,50	330 €
3.1.1 : Tri de la liste des membres	0,5	1	2	1,08	65 €
3.1.2 : Filtrage de la liste des membres	0,5	1	1,5	1,00	60 €
3.1.3 : Tri & filtrage (simultané) de la liste des membres	1	1,5	2	1,50	90 €
3.1.4 : Ergonomie affichage	1	2	2,5	1,92	115 €
	3	4,5	8	4,83	290 €
3.2.1 : Modification paiement	0,5	1	2	1,08	65 €
3.2.2 : Suppression paiement	1	1	2,5	1,25	75 €
3.2.3 : Désinscription d'un élève à un cours	1,5	2,5	3,5	2,50	150 €
	1,5	2,5	4	2,58	155 €
3.3.1 : Mails de rappel	0,5	1	2	1,08	65 €
3.3.2 : Génération de factures	1	1,5	2	1,50	90 €

Gantt prévisionnel

cf. fichier D1_LEFRANÇOIS_UDIN--YVER_DELERUE-1.pdf

Charges réelles

38 heures
de travail

Sous-Lots	Estimation	Réelles
	11,92	11,155
1.1 : Interface / affichage	5,17	11
1.2 : Contenu du mail	1,08	0,125
1.3 : Contenu de la facture	2,17	0
1.4 : Prérequis de suppression de paiement	3,50	0,03
	23,50	26,2
	4,42	21
2.1.1 : Tri de la liste des membres (par saison, ordre alphabétique et cours)	2,42	19
2.1.2 : Filtrage de la liste des membres (sur les cours et sur les membres ayant payés /	2,00	2
	14,17	4
2.2.1 : Modification paiement	4,00	1,5
2.2.2 : Suppression paiement	5,17	0,5
2.2.3 : Désinscription d'un utilisateur à ses cours en cas de non paiement post-rappel	5,00	2
	4,92	1,2
2.3.1 : Mails de rappel	1,50	0,2
2.3.2 : Génération de factures de cotisation annuelle	3,42	1
	12,92	0,6625
	5,50	0,23
3.1.1 : Tri de la liste des membres	1,08	0,02
3.1.2 : Filtrage de la liste des membres	1,00	0,02
3.1.3 : Tri & filtrage (simultané) de la liste des membres	1,50	0,16
3.1.4 : Ergonomie affichage	1,92	0,03
	4,83	0,1
3.2.1 : Modification paiement	1,08	0,08
3.2.2 : Suppression paiement	1,25	0,01
3.2.3 : Désinscription d'un élève à un cours	2,50	0,01
	2,58	0,3325
3.3.1 : Mails de rappel	1,08	0,0125
3.3.2 : Génération de factures	1,50	0,32

Difficultés et réponses mises en œuvre

Difficultés rencontrés :

- Création d'un Organigramme des Tâches convenant au professeur
- Gestion de Project Libre
- Compréhension des consignes
- Absence prolongée inexpliquée d'un de nos membres

Réponse mise en œuvre :

- Réorganisation de l'OT & recherche d'un OT plus visuel
- Appel à l'aide envoyé aux professeurs
- Reprise des consignes une par une
- Redistribution des tâches

Commentaires et explications sur les rapports

cf. fichier D1_LEFRANÇOIS_UDIN--YVER_DELERUE_reel.pdf

Conclusion

Améliorations possibles

- Avoir JavaFX sur nos ordinateurs personnels
- Mieux répartir le travail entre les membres
- Plus se renseigner sur les possibilités qu'offrent les outils utilisés (tels que JavaFX)

Apports personnels

- Mael U. : disponibilité, expérience en gestion de listes
- Julien : disponibilité, expérience en création et en gestion d'interfaces
- Maël D. : N/A
